

CHANTIERS 2024 - ALBUM



10 chantiers prévus, 1 annulé

| Période | Chantier | Nb pers | Jours travaux produits | Responsable Travaux |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------|----------------------|
| 1 au 4 août | AILSM | 15 | 33 | André Perramant |
| 5 au 10 août | AILSM + Rempart | 14 | 54 | Thierry Rialland |
| 12 au 17 août | AILSM + Rempart | 15 | 50 | Benoit Mesnier |
| 19 au 23 août | AILSM + Rempart | 15 | 42 | Yves Machefer |
| 26 au 30 août | Jeunes Saint Aubin sur Mer + Rempart | 15 | 39 | Marion Thomas |
| 2 au 5 septembre | AILSM + GEOTEC | 13 | 20 | Philippe Hamel |
| 9 au 13 septembre | Mission Locale Saint Lo / Carentan | 13 | 30 | Charles-Louis Roseau |
| 16 au 20 septembre | Laplace | 15 | 45 | Vincent Debroise |
| 28 au 29 septembre | DSO | 9 | 5 | Christophe Bois |
| 30 septembre au 4 octobre | Mission Locale Cherbourg | 12 | 0 | Lucille Leroy |
| 4 au 5 octobre | AILSM | 7 | 4 | Thomas Pertriaux |


9 chantiers réalisés, avec une centaine de personnes ayant produit environ 318 jours de travail

1 chantier annulé pour cause de mauvais temps : du 30 septembre au 4 octobre, Mission Locale Cherbourg

Ouverture Ile (1 au 4 aout)

Responsable: André Perramant, 15 personnes, 33 jours de travail

Gros débroussaillage, mise en service cuisine, composteur et sanitaires, installation du monte charge, mise en place d'un nouveau système d'amarrage du ponton, de pneus autour échelle, de nouvelles cordes à linge et d'un bout le long du rempart du port, mise en place du ponton ...

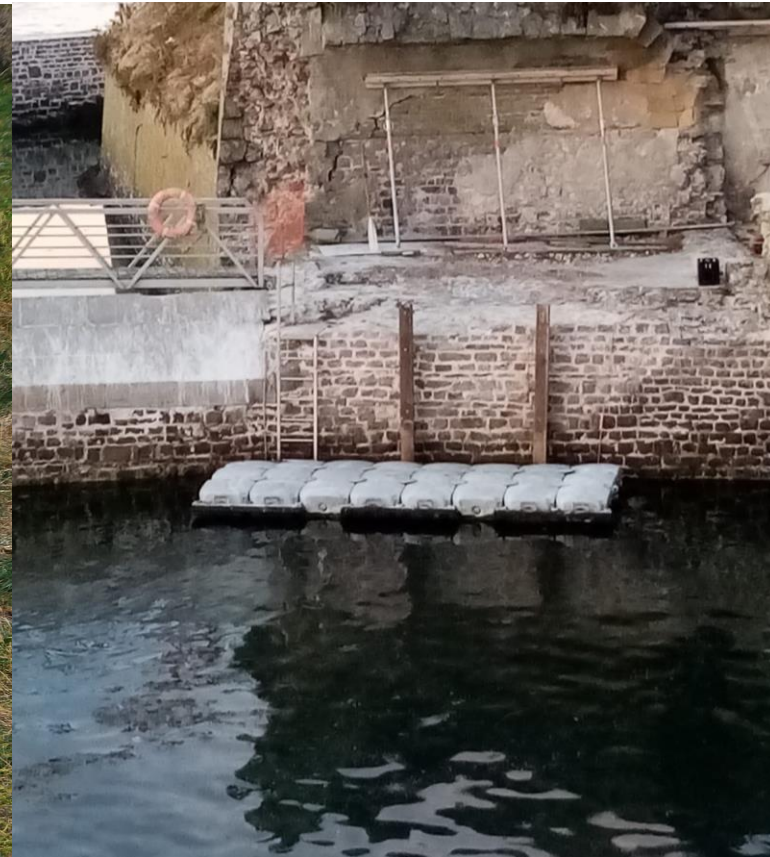

Chantier du 5 au 10 aout

Responsable Thierry Rialland, 14 personnes, 54 jours de travail

Travaux sur la digue Nord, le mur de soutènement autour tentes et la cale d'échouage



Chantier du 12 au 17 aout

Responsable Benoit Mesnier, 15 personnes dont 3 issues de structures sociales, 50 jours de travail

Travaux sur le musoir, la digue de la cognée et le mur de soutènement autour des tentes



Chantier du 19 au 23 aout

Responsable Yves Machefer, 15 personnes, 42 jours de travail
Travaux sur le caniveau du port et les murs de soutènement



Chantier du 26 au 30 aout

Responsable Marion Thomas, 15 personnes dont 5 jeunes (<18 ans) de Saint Aubin,
39 jours de travail


Travaux sur les murs de soutènement et sur le mur de la terrasse de l'amiral



Chantier du 2 au 5 septembre

Responsable Philippe Hamel, 13 personnes dont 3 de l'entreprise GEOTEC, 20 jours de travail

Purge terrasse en vue de sa réfection (nouvelle chape), entretien des perches, améliorations sur l'amarrage du ponton, carottage de la digue

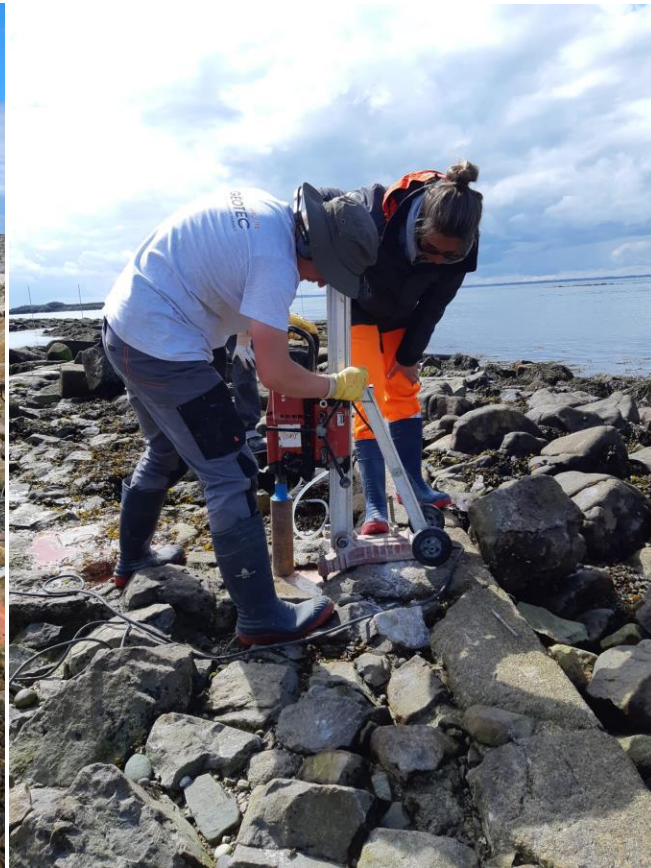

Chantier du 9 au 13 septembre (S36)

Responsable Charles-Louis Roseau, 13 personnes don 8 jeunes de la Mission Locale Saint-Lo /Carentan, 30 jours de travail

Travaux sur la cale d'échouage, le corps de garde et la terrasse de l'amiral (coulis de chaux avant la chape)



Chantier du 16 au 20 septembre

Responsable Vincent Debroise, 15 personnes dont 10 élèves, 45 jours de travail
Travaux sur la terrasse de l'amiral (chape), le couronnement de la poudrière, le passage sous traverse et le caniveau du rempart du port



<https://photos.app.goo.gl/TbkRVGCFWYbX4kKX9>



Chantier du 28 au 29 septembre

Responsable Christophe Bois,
9 personnes, 5 jours de travail
Déblaiement des douves



Chantier du 4 au 5 octobre

Responsable Thomas Pertriaux, 7 personnes, 4 jours de travail
Protection de la digue sud, rapatriement de matériels

